TEO GEOK YAN
A-162, Aurora Resort,
Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral,
79100 Iskandar Puteri,
Johor.

E-mel: gyteo97@gmail.com
Tel: +65 8617 8812

COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A)
(Pejabat Pengurusan / Management Office)
Aurora Resort, Aurora Sentral,
Jalan Aurora Utama,
79100 Iskandar Puteri,
Johor. 12 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/035

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Intermediate (2,833 kaki persegi, Unit L247) di A-162, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor

Saya, TEO GEOK YAN (No. K/P: 970729-01-6582), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Aurora Resort Villas, Fasa 1, Aurora Sentral), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual H, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 21 Disember 2023 dengan rujukan 8428-23/eSPA/141223/247/01 (Lot 247, Aurora Resort Fasa 1), merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/035 bertarikh 2 September 2026 yang telah dihantar kepada pihak tuan melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) No. RW214680799MY pada 5 September 2026 dan telah DITERIMA oleh pihak tuan pada 23 September 2026 — diakui terima oleh wakil pihak tuan, Puan Norfarhana, dengan tandatangan dan cop rasmi syarikat pada kad Akuan Terima (AR) Pos Malaysia (dilampirkan sebagai Lampiran C) — susulan Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang dikemukakan melalui aplikasi CVConnect pada 1 dan 2 Julai 2025 (Defect 728811-2 dan 228839-3) selaras dengan Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]. Notis Pertama tersebut telah memberikan tempoh lima belas (15) hari kepada pihak tuan untuk menyiapkan semua kerja pembaikan, iaitu sehingga 17 September 2026.

2. Namun, tempoh Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 17 September 2026 tanpa sebarang pembaikan disempurnakan dan tanpa sebarang maklum balas

rasmi daripada pihak tuan. Sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan, dan kesemua sembilan (9) kes kecacatan yang diserahkan melalui aplikasi CVConnect pada 28 Ogos 2026 dan 1 September 2026 masih berstatus Pending — sebagaimana dibuktikan oleh paparan CVConnect Dashboard pihak tuan sendiri yang dilampirkan sebagai Lampiran B (9 Pending, 0 In Progress). Ini jelas menunjukkan kegagalan pihak tuan mematuhi Notis Pertama. Kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
40	Living & Dining — Ceiling	Kebocoran pada permukaan siling masih ada (Leaking on ceiling surface still observed — bukti kamera termal)	Belum Diselesaikan
159	Balcony — Wall	Hollowness pada bahagian atas dinding masih ada (Hollowness on top of the wall still observed)	Belum Diselesaikan
193	Bedroom 3 — Wall	Kelembapan sederhana pada permukaan dinding masih ada (Medium moisture on wall surface still observed — bukti kamera termal)	Belum Diselesaikan
233	Ceiling Area (Master Bedroom) — Wall	Besi tetulang RC terdedah pada tiang masih ada (Exposed steel RC on column still observed)	Belum Diselesaikan
238	Water Tank Area — Floor	Air bertakung pada permukaan papak masih ada (Stagnant water on slab surface still observed)	Belum Diselesaikan
244	Water Tank Area — Ceiling	Kerosakan pada papan siling masih ada (Damaged on ceiling board still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
245	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tangki air masih dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition still observed)	Belum Diselesaikan
252	RC Flat Roof — Floor	Keretakan pada papak lantai masih ada — keseluruhan lantai (Crack on floor slab still observed — All floor area)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 27 Ogos 2026 serta 9 kes kecacatan di dalam aplikasi*

CVConnect (Defect 440028-4, 940037-5, 440046-6, 840052-7, 540067-8, 140075-9, 840083-10, 940098-11 & 940157-12).

3. Untuk makluman pihak tuan, kes asal Defect 728811-2 dan 228839-3 telah ditandakan sebagai "Completed" di dalam sistem pihak tuan, sedangkan Pemeriksaan Semula pada 27 Ogos 2026 membuktikan kecacatan yang sama masih wujud dan belum dibaiki. Ini merupakan salah nyata status pembaikan. Sehubungan itu, saya menuntut agar sebarang kes kecacatan hanya ditutup selepas pembaikan disahkan oleh pemilik, dan penutupan kes secara unilateral tanpa pengesahan pemilik tidak akan diterima pakai.

4. Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain (any defect, shrinkage or other faults) yang menjadi ketara dalam tempoh dua puluh empat (24) bulan selepas pembeli mengambil milikan kosong, yang disebabkan oleh mutu kerja atau bahan yang cacat, hendaklah dibaiki dan diperbetulkan oleh pemaju atas kos dan belanjanya sendiri dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.

5. Dengan ini, saya mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 27 Oktober 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan melalui kedua-dua notis, selaras dengan Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli.

6. Bagi makluman pihak tuan, saya telah pun memperoleh sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor berdaftar CIDB bagi kesemua kerja pembaikan yang masih tertunggak — Go Xpert Solution, No. Sebut Harga GXS-RW-2026-00202605 bertarikh 6 Oktober 2026 — dengan jumlah keseluruhan RM25,565.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Sahaja), merangkumi 18 item kerja termasuk kerja pembaikan elektrik oleh pendawai berdaftar, rawatan tetulang terdedah, kerja kalis air (waterproofing) dan pembaikan keretakan keseluruhan rumah. Salinan penuh sebut harga tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A. Sekiranya pihak tuan masih gagal menyiapkan semua kerja pembaikan dalam tempoh notis ini, jumlah tersebut atau kos sebenar yang ditanggung akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan, termasuk melalui tolakan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) yang dipegang oleh peguam pemegang (stakeholder) dan/atau tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR).

7. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh akhir MUKTAMAD tersebut, saya akan TANPA RUJUKAN LANJUT:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
    - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh peguam pemegang (stakeholder), M/s K.H. Koh, Azhar & Koh, selaras dengan Klausa 30(2) Jadual H Perjanjian Jual Beli;
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
    - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

8. Merujuk kepada Klausa 32(1) (Service of Documents) Jadual H Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi. Notis ini dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) dan salinannya dimaklumkan kepada peguam pemegang wang tahanan (stakeholder) untuk makluman dan tindakan lanjut berhubung wang tahanan lima peratus (5%).

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Ini merupakan NOTIS TERAKHIR sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Sebarang kegagalan pihak tuan mematuhi notis ini akan dijadikan bukti kegagalan dan keengganan pihak tuan di hadapan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan/atau mahkamah yang berbidang kuasa, dan segala kos yang ditanggung akibat kegagalan tersebut akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,



(TEO GEOK YAN)

E-mel: gyteo97@gmail.com
Telefon: +65 8617 8812

s.k. (CC):

M/s K.H. KOH, AZHAR & KOH (Peguam Pemegang Wang Tahanan / Stakeholder) — Suite 25-03, Level 25, Menara Landmark, No. 12, Jalan Ngee Heng, 80000 Johor Bahru, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
21 Disember 2023	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Jadual H (Ruj: 8428-23/eSPA/141223/247/01), Lot 247, Aurora Resort Fasa 1
1 & 2 Julai 2025	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan melalui aplikasi CVConnect — Defect 728811-2 dan 228839-3
Ogos 2025	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
27 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan
28 Ogos 2026	8 kes kecacatan baharu diserahkan melalui aplikasi CVConnect (Defect 440028-4, 940037-5, 440046-6, 840052-7, 540067-8, 140075-9, 840083-10, 940098-11) — semua masih Pending
1 September 2026	1 kes kecacatan tambahan diserahkan melalui aplikasi CVConnect (Defect 940157-12) — masih Pending
2 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/035
5 September 2026	Notis Pertama dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) No. RW214680799MY
23 September 2026	Notis Pertama DITERIMA oleh pihak pemaju — diakui oleh Puan Norfarhana dengan tandatangan dan cop rasmi syarikat (rujuk Lampiran C)
17 September 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — pembaikan masih tidak disempurnakan, tiada maklum balas rasmi
6 Oktober 2026	Sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) No. GXS-RW-2026-00202605 berjumlah RM25,565.00 diperoleh daripada kontraktor berdaftar CIDB
12 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/035, bersama sebut harga rasmi pembaikan
27 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

LAMPIRAN A

Sebut Harga Rasmi Pembaikan GXS-RW-2026-00202605 — muka 1 daripada 5

GO XPERT SOLUTION
BUILDING INSPECTION & SURVEYING
Nook Workspace, Taman Damansara Aliff, 81200 Johor Bahru, Johor
+6011-3144 6591 · official@goxpert.my · SSM: 202503234804 (003768196-A)
CIDB No.: 0120250929-JH161484

SEBUT HARGA

Kerja Pembaikan Defect

Bangunan sedia ada — A-162, Aurora Resort
Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor

NO. SEBUT HARGA	TARIKH	SAH SEHINGGA	DISEDIAKAN OLEH
GXS-RW-2026-00202605	**6 Oktober 2026**	**20 Oktober 2026**	**Fikri Rahman**

KEPADA	SKOP
TEO GEOK YAN A-162, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor +65 8617 8812 · gyteo97@gmail.com	**Kerja membaik pulih defect** Bangunan sedia ada — A-162, Aurora Resort 18 item kerja seperti disenaraikan Pelaksana: Go Xpert Solution (CIDB berdaftar)

Dengan segala hormatnya, Go Xpert Solution ingin mengemukakan sebut harga bagi kerja membaik pulih defect di bangunan sedia ada beralamat A-162, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor. Skop, kuantiti dan harga adalah seperti dalam jadual berikut.

Go Xpert Solution · SSM 202503234804 (003768196-A) · Page 1 of 5

LAMPIRAN A (sambungan)

Sebut Harga Rasmi Pembaikan GXS-RW-2026-00202605 — muka 2 daripada 5

1. Jadual kerja dan harga

Semua harga dalam Ringgit Malaysia (RM), termasuk bahan dan upah, tidak termasuk SST (jika berkenaan).

No.	Perincian kerja	Unit	Jumlah (RM)
1	**Mengecat semula pagar rumah dan railing yang berkarat** Buang karat secara mekanikal, sapu primer anti-karat 1 lapis dan cat besi 2 lapis. Meliputi pagar utama dan railing sedia ada.	L/S	500.00
2	**Menukar pintu refuse chamber yang rosak (custom size)** Bekal dan pasang pintu baharu mengikut saiz sedia ada, termasuk engsel dan selak.	L/S	200.00
3	**Menukar jubin yang rosak dan kosong (hollow)** Pecah jubin terlibat, bersih permukaan, pasang semula dan grouting. **Had sehingga 20 keping**; lebihan dicaj RM35 sekeping. Jubin sepadan tertakluk kepada stok pasaran — jika tiada, jubin paling hampir akan digunakan dengan persetujuan Client.	L/S	1,000.00
4	**Memasang earth chamber cover yang baharu** Bekal dan pasang penutup earth chamber baharu.	L/S	55.00
5	**Mengecat semula pintu dan menukar aksesori pintu yang rosak** Cat semula pintu sedia ada 2 lapis dan ganti aksesori rosak (tombol, engsel, door stopper) sehingga 4 titik.	L/S	150.00
6	**Memecah plaster hollow, render semula, skim dan cat semula** Lebih kurang 2–3 m² (2 titik). Pecah plaster hollow, render semula, skim dan cat semula sehingga sepadan dengan kawasan sekeliling.	L/S	800.00
7	**Kerja levelling di lantai flat roof dan kawasan tangki air** Screed levelling dengan kecerunan ke arah outlet (lebih kurang 1:100) supaya tiada air bertakung. **Tidak termasuk waterproofing** — rujuk Item 15.	L/S	1,000.00
8	**Penukaran ceiling board yang rosak** Ganti papan siling terlibat, skim sambungan dan cat semula. Lebih kurang 2 keping (± 48 kaki persegi).	1 lot	200.00
9	**Kerja pembersihan tangki air** Kosongkan tangki, cuci dinding dan dasar tangki, bilas dan isi semula.	1 lot	350.00
10	**Penukaran waterproof socket di kawasan tangki air** Bekal dan pasang socket kalis air gred IP, oleh pendawai berdaftar.	1 lot	60.00
11	**Penukaran bukaan / pintu di ruang dapur** Bekal dan pasang bukaan atau pintu baharu mengikut saiz sedia ada.	L/S	200.00
12	**Memecah konkrit longgar, merawat tetulang terdedah dan pemulihan mortar** Pecah konkrit longgar sehingga permukaan padu, bersihkan tetulang terdedah, sapu rawatan anti-kakisan dan baiki dengan mortar pembaikan yang sesuai.	L/S	350.00
13	**Membaiki keretakan dinding dan lantai seluruh rumah, kerja pembetulan permukaan serta mengecat semula semua dinding** Potong (rout) retak, isi dengan filler yang sesuai, pasang fibre mesh pada retak yang memerlukan, skim dan cat semula 2 lapis (cat emulsi dalaman gred standard, warna sedia ada atau pilihan Client). Termasuk juga: • Skim dan grinding pada permukaan kasar (rough surface) dan permukaan tidak rata (uneven surface) • Tampal dan tutup lubang kecil pada dinding dan siling • Pemasangan sealant pada kawasan yang memerlukan, termasuk keliling tingkap, bingkai pintu dan sambungan antara permukaan • Kerja-kerja kecil berkaitan bagi memperoleh kemasan yang kemas dan seragam **Had merangkumi sehingga 60 meter panjang retak dan lebih kurang 2,500 kaki persegi permukaan dinding.** Kuantiti melebihi had dicaj sebagai kerja tambahan.	L/S	10,000.00

LAMPIRAN A (sambungan)

Sebut Harga Rasmi Pembaikan GXS-RW-2026-00202605 — muka 3 daripada 5

No.	Perincian kerja	Unit	Jumlah (RM)
14	**Kerja pembaikan kecacatan elektrik** Dilaksanakan oleh pendawai berdaftar dan sijil ujian diserahkan kepada Client: • Bekal dan pasang wayar ikatan bumi (hijau/kuning) dari titik pembumian pintu panel ke bar bumi, termasuk ujian keterusan • Baiki warna pendawaian fasa yang salah pada litar MCB (fasa kuning dan biru), sambung semula ke fasa yang betul dan uji • Bekal dan pasang RCCB 10 mA (2 kutub, diluluskan SIRIM) untuk litar pam air, termasuk trip test • Kesan dan baiki pendawaian suis pam air supaya memutuskan konduktor hidup; bekal dan pasang suis pemencil dua kutub jika perlu • Bekal dan pasang penutup PVC pada semua junction box terdedah di siling Bilik Tidur Utama	L/S	1,800.00
15	**Membaiki retak dan memasang lapisan kalis air pada slab terdedah di atas Bilik Air 3, serta membaiki dan mengecat semula siling bilik terlibat** Baiki retak slab, sapu sistem waterproofing (cement-based atau PU) dengan upturn pada tepi, **ponding test 24 jam** sebelum kerja kemasan, kemudian baiki dan cat semula siling terlibat. **Waranti waterproofing 5 tahun** tertakluk kepada tiada kerja lain dibuat ke atas slab tersebut.	L/S	6,000.00
16	**Hacking jubin tandas Bilik Tidur Utama, memasang lapisan kalis air dan memasang semula jubin** Pecah jubin lantai sedia ada, sapu waterproofing dengan upturn ke dinding 300 mm, **ponding test 24 jam**, pasang semula jubin dan grouting. **Bekalan jubin: PC sum RM8 sekaki persegi** — jika Client memilih jubin yang lebih mahal, perbezaan harga dicaj berasingan.	L/S	2,000.00
17	**Kerja pembersihan dan housekeeping** Bersihkan kotoran yang melekat pada item terlibat dan kemas kawasan kerja selepas siap.	L/S	300.00
18	**Menyediakan tong sampah (3 hari)** Sewa tong sampah termasuk penghantaran dan pelupusan sisa binaan am.	L/S	600.00
		JUMLAH BESAR (RM)	**25,565.00**

Item 3, 15 dan 16 mengandungi had kuantiti atau PC sum seperti dinyatakan. Kerja melebihi had tersebut akan dimaklumkan dan dipersetujui secara bertulis sebelum dilaksanakan.

LAMPIRAN A (sambungan)

Sebut Harga Rasmi Pembaikan GXS-RW-2026-00202605 — muka 4 daripada 5

2. Terma bayaran, tempoh kerja dan waranti

TERMA BAYARAN

Deposit 50% semasa penerimaan — **RM12,782.50**
Baki 50% selepas kerja siap dan diperiksa — **RM12,782.50**

Resit hendaklah dihantar ke WhatsApp +6011-3144 6591

TEMPOH KERJA

Mula: dalam tempoh 7 hari dari penerimaan deposit
Tempoh kerja: lebih kurang 14 hari bekerja
Tertakluk kepada cuaca, akses dan ketersediaan bahan

WARANTI

Kerja am: 6 bulan dari tarikh siap
Waterproofing (Item 15 & 16): 5 tahun

3. Pengecualian

Harga di atas tidak termasuk perkara berikut. Sekiranya Client memerlukan mana-mana kerja ini, ia akan disebut harga secara berasingan dan dipersetujui secara bertulis sebelum dilaksanakan.

TIDAK TERMASUK — MENUNGGU PENGESAHAN CLIENT

Dua perkara berikut **tidak termasuk dalam sebut harga ini**. Client bercadang merujuk kedua-duanya kepada pemaju terlebih dahulu. Sekiranya pemaju mengesahkan ia sebagai defect dan Client memutuskan untuk melaksanakan kerja tersebut melalui Go Xpert Solution, ia akan disebut harga secara berasingan mengikut skop sebenar.

1. **Agihan fasa ke sub DB.** Hanya fasa merah disalurkan ke sub DB. Memerlukan semakan beban dan lukisan single line diagram sebelum skop dan harga dapat ditentukan.
2. **Pemasangan paip heater untuk besin — semua tandas.** Paip heater besin didapati belum dipasang. Skop meliputi semua tandas di dalam unit, dan kuantiti sebenar akan disahkan di tapak.

Berkaitan strata dan pengurusan bangunan

- Kerja pada common property atau struktur bangunan di bawah bidang kuasa JMB / MC
- Punca kebocoran yang berasal dari unit di atas, unit bersebelahan atau fasad bangunan
- Deposit renovasi, caj permit, caj penggunaan lif atau sebarang bayaran kepada pihak pengurusan bangunan
- Kerja di luar waktu kerja biasa atau pada hujung minggu, sekiranya dikehendaki oleh pihak pengurusan

Berkaitan kerja dan bahan

- Kerja struktur, kerja yang memerlukan kelulusan pihak berkuasa atau pengesahan jurutera
- Defect tersembunyi yang hanya ditemui selepas kerja pecah atau buka dilakukan
- Jubin bersebelahan yang retak atau terlerai semasa kerja hacking, berikutan keadaan jubin sedia ada
- Perbezaan warna cat atau jubin akibat produk asal tidak lagi dikeluarkan atau warna sedia ada telah pudar
- Defect yang berulang akibat pergerakan struktur bangunan atau penurunan
- Pembaikan paip tersembunyi di dalam dinding atau lantai, melainkan dinyatakan dalam jadual
- Kerja cat atau waterproofing pada kawasan selain yang dinyatakan dalam jadual
- Perancah khas, gondola atau kerja akses tali

Elektrik, ujian dan lain-lain

- Semakan agihan fasa dan beban sub DB, serta pemasangan paip heater besin — rujuk kotak di atas
- Kerja pendawaian semula, penukaran DB atau naik taraf beban elektrik
- Ujian makmal, ujian kualiti air atau sebarang pensijilan, selain sijil ujian elektrik bagi Item 14
- Rawatan anai-anai, kulat atau pembasmian serangga
- Pemindahan atau penyimpanan perabot dan barangan peribadi
- Pelupusan sisa berjadual atau bahan yang mengandungi asbestos
- Kos SST, jika dikenakan

4. Tanggungjawab Client

- Menyediakan akses ke unit sepanjang waktu kerja yang dipersetujui
- Menyediakan bekalan air dan elektrik di tapak tanpa kos
- Mengosongkan atau menutup perabot dan barangan peribadi di kawasan kerja
- Mendapatkan kebenaran pengurusan bangunan atau JMB untuk kerja, penggunaan lif dan tong sampah
- Membuat pemilihan warna cat dan jenis jubin sebelum kerja berkaitan bermula

5. Terma dan syarat

1. Sebut harga ini sah selama empat belas (14) hari dari tarikh dikeluarkan.
2. Kerja hanya akan dijadualkan selepas sebut harga ditandatangani dan deposit diterima.
3. Semua bayaran hendaklah dibuat ke akaun bank yang dinyatakan. Resit hendaklah dihantar melalui WhatsApp untuk pengesahan.
4. Kuantiti yang dinyatakan sebagai had (Item 3 dan 13) dan PC sum (Item 16) akan diselaraskan mengikut kuantiti sebenar di tapak. Sebarang kerja tambahan akan dimaklumkan dan dipersetujui secara bertulis sebelum dilaksanakan.
5. Ujian ponding selama 24 jam akan dijalankan selepas kerja waterproofing dan sebelum kerja kemasan. Client atau wakilnya dialu-alukan hadir semasa ujian.
6. Kerja elektrik dilaksanakan oleh pendawai berdaftar. Sijil atau rekod ujian akan diserahkan kepada Client selepas kerja siap.
7. Waranti tidak meliputi kerosakan akibat kerja pihak ketiga, pengubahsuaian selepas kerja siap, bencana alam, atau kegagalan penyelenggaraan asas seperti outlet tersumbat.
8. Go Xpert Solution boleh menangguhkan kerja sekiranya cuaca tidak selamat, akses tidak disediakan atau berlaku force majeure, dengan notis kepada Client.
9. Sekiranya Client membatalkan kerja selepas deposit dibayar, deposit boleh ditahan bagi menampung kos persediaan, bahan yang telah dipesan dan mobilisasi.
10. Kerja dianggap siap setelah pemeriksaan bersama dijalankan dan senarai semak diterima oleh kedua-dua pihak.
11. Liabiliti Go Xpert Solution terhad kepada jumlah bayaran yang telah diterima bagi kerja ini.
12. Sebut harga ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian akan diselesaikan secara perbincangan terlebih dahulu, dan jika gagal, dirujuk kepada mahkamah di Johor Bahru.

6. Penerimaan

Dengan menandatangani di bawah, Client menerima skop kerja, harga, terma bayaran, pengecualian serta terma dan syarat dalam sebut harga ini.


DITERIMA OLEH (CLIENT)	DISEDIAKAN OLEH (GO XPERT SOLUTION)
Nama: _____	_____
Tarikh: _____	**Nur Dastie binti Nordin**
Tandatangan:	General Manager
_____	Go Xpert Solution
	+6011-3144 6591 · official@goxpert.my
	Tarikh: 6 Oktober 2026

TERIMA KASIH

+6011-3144 6591 · official@goxpert.my

LAMPIRAN B


Status Kes Kecacatan di dalam Aplikasi CVConnect Pihak Pemaju

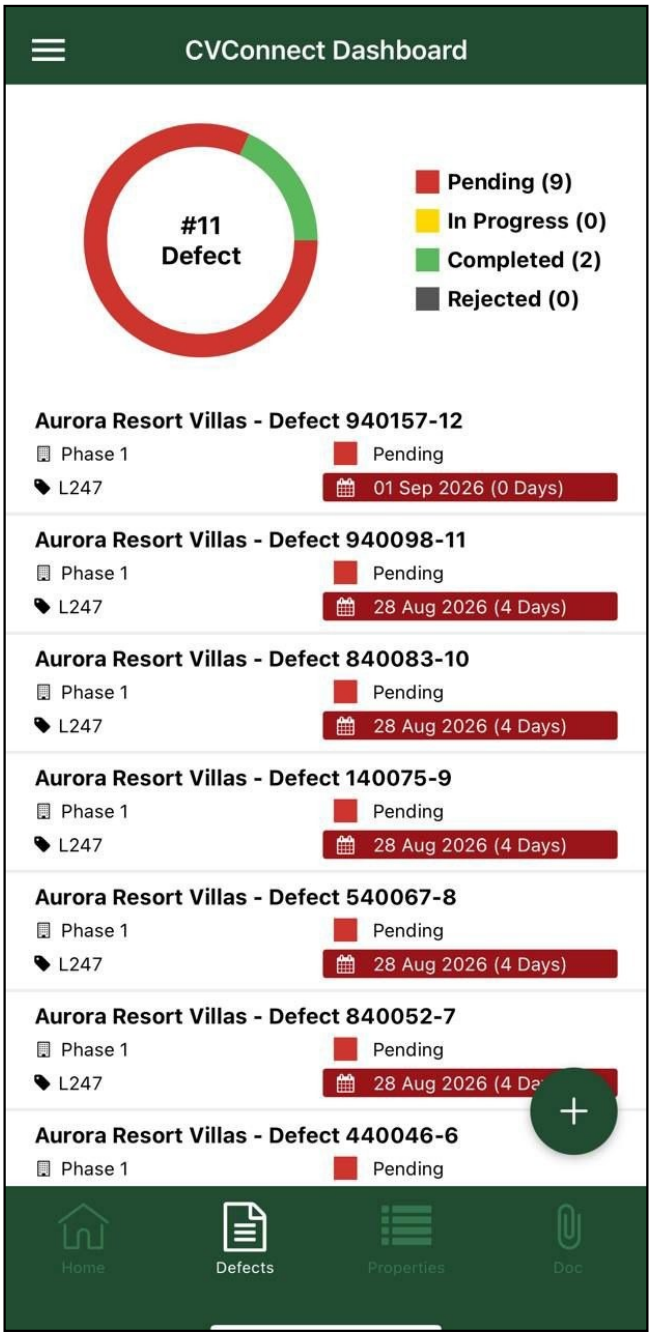

Paparan CVConnect Dashboard (Unit L247, Aurora Resort Villas Fasa 1) — 11 kes kecacatan: 9 masih berstatus PENDING (termasuk Defect 940157-12, 940098-11, 840083-10, 140075-9, 540067-8, 840052-7 dan 440046-6), 0 In Progress, dan hanya 2 Completed. Tiada sebarang kerja pembaikan dimulakan terhadap kes-kes yang diserahkan sejak 28 Ogos 2026 dan 1 September 2026.

LAMPIRAN C

Bukti Penghantaran & Penerimaan Notis Pertama (Pos Berdaftar AR)

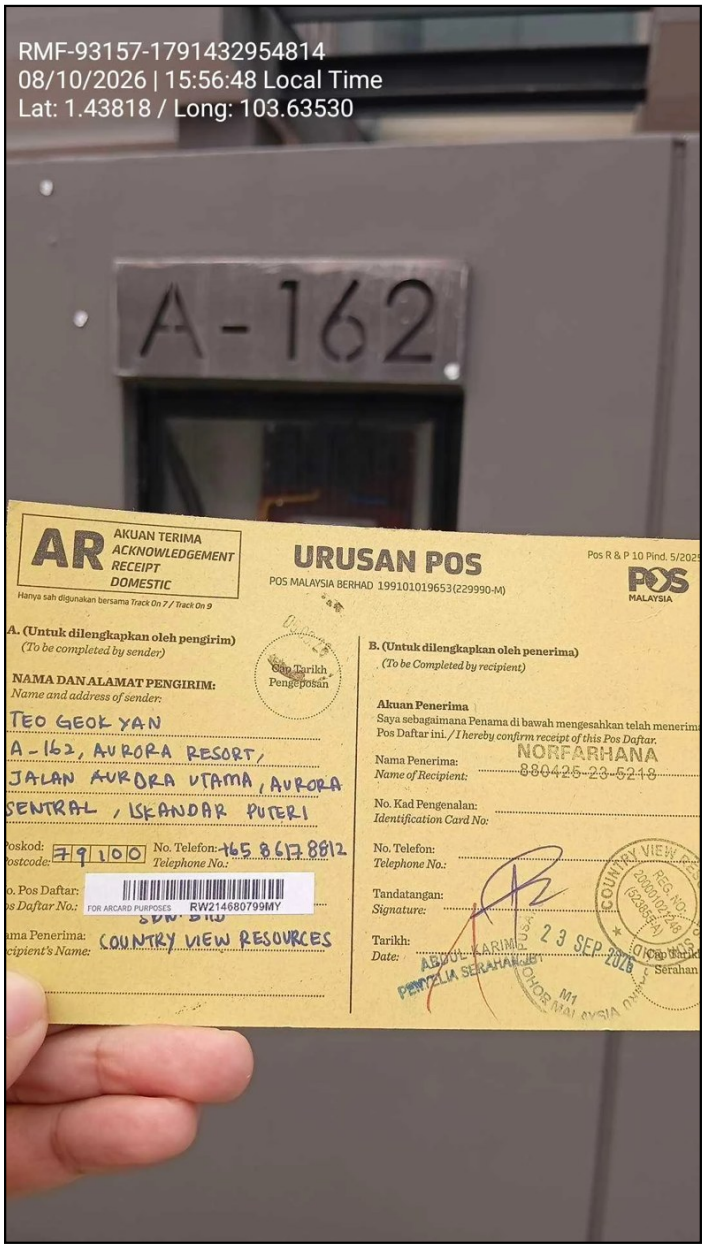

Kad Akuan Terima (AR) Pos Malaysia No. RW214680799MY — Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/035) diposkan pada 5 September 2026 kepada Country View Resources Sdn Bhd dan DITERIMA pada 23 September 2026, diakui oleh Puan Norfarhana dengan tandatangan dan cop rasmi syarikat (Reg. No. 200001021248 / 523855-A), disahkan oleh Penyelia Serahan Pos Malaysia.

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 12 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/035 daripada TEO GEOK YAN berhubung hartanah di A-162, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN BHD (200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 12 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/035 daripada TEO GEOK YAN berhubung hartanah di A-162, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79100 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):
