MOHD HAFIZ SAIFUL NIZAM BIN M ROSLI
No. 46, Jalan Perjiranan 13/3,
Bandar Dato' Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: hafizsaifulnizam@gmail.com
Tel: 017-737 3410

JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K)
(dahulu dikenali sebagai Johor Land Berhad)
Pejabat Tapak (Site Office),
No. 83, Jalan Perjiranan 15/1, Perjiranan 15,
Bandar Dato' Onn,
81100 Johor Bahru, Johor. 3 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/064

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Terrace House 2 Storey, Built-up 2,052 kps) di No. 46, Jalan Perjiranan 13/3, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor

Saya, MOHD HAFIZ SAIFUL NIZAM BIN M ROSLI, pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Bandar Dato' Onn, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) yang ditandatangani dengan pihak tuan, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Full House Inspection) pada 15 September 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi rasmi JLG KITA pihak tuan pada 22 September 2026, dengan sebanyak 268 kes kecacatan direkodkan. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 22 Oktober 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan rekod aplikasi JLG KITA pihak tuan sendiri menunjukkan kesemua DUA RATUS ENAM PULUH LAPAN (268) kes kecacatan tersebut masih berstatus "In Progress" tanpa sebarang kerja pembaikan dijalankan di hartanah saya (Lampiran A). Lebih mendukacitakan, saya telah menghubungi Customer Service pihak tuan melalui WhatsApp secara berulang kali — pada 2 Oktober, 8 Oktober, 12 Oktober dan 26 Oktober 2026 — bertanyakan status dan tarikh mula pembaikan, namun TIADA SATU PUN balasan diterima (Lampiran B). Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan (Antaranya):

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
199	Bathroom 2 — Dinding	Jubin dinding tidak dipasang penuh hingga paras siling (Wall tiles should be full height to ceiling level) — tidak mengikut spesifikasi kemasan di dalam S&P	Masih Belum Diselesaikan
232	Bathroom 3 — Paip & Sanitari	Sisa binaan di dalam perangkap lantai menjejaskan saliran (Construction debris found inside the floor trap — Poor Drainage System)	Masih Belum Diselesaikan
244	Flat Roof 3 (Kiri) — Lantai	Kesan air bertakung pada permukaan papak (Sign of water stagnant on slab — Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan
257	Top Roof — Bumbung	Kerosakan pada perabung bumbung (Damage on roof ridge)	Masih Belum Diselesaikan
259	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung rosak (Damage on roof tiles)	Masih Belum Diselesaikan
260	Top Roof — Bumbung	Kerosakan pada lapisan membran (Damage on membrane sheet)	Masih Belum Diselesaikan
261	Top Roof — Bumbung	Kedapan tidak sempurna di sekeliling roof flashing (Improper seal around roof flashing — Jointing Issue)	Masih Belum Diselesaikan
267	Yard — Paip & Sanitari	Sisa binaan dan lurang (manhole) tersumbat (Construction leftover and clogged manhole — Poor Drainage System)	Masih Belum Diselesaikan
285	Ceiling Area (Family Area) — Siling	Kesan kulat pada permukaan siling (Fungus mark on ceiling surface)	Masih Belum Diselesaikan
293	Water Tank Area	Tangki air di dalam keadaan kotor — perlu dibersihkan (Water tank need to be clean)	Masih Belum Diselesaikan
294	Water Tank Area	Penutup tangki air tidak tertutup rapat dan sukar ditutup (Water tank not closed fully and hard to close)	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas BUKANLAH senarai penuh — ia hanya sebahagian daripada DUA RATUS ENAM PULUH LAPAN (268) kes kecacatan yang direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan dan aplikasi JLG KITA pihak tuan pada 22 September 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung — item No. 257 (kerosakan perabung), No. 259 (genting rosak), No. 260 (kerosakan lapisan membran) dan No. 261 (kedapan tidak sempurna sekeliling roof flashing). Kecacatan-kecacatan ini menjejaskan integriti keseluruhan sistem bumbung dan mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat — malah kesan kulat TELAH PUN dikesan pada permukaan siling Family Area (item No. 285), yang menunjukkan resapan lembapan sedang berlaku. Genting dan perabung yang rosak WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), lapisan membran dan kedapan flashing hendaklah dibaiki mengikut spesifikasi pengilang, dan PUNCA kesan kulat pada siling hendaklah dikesan dan dibaiki — bukan sekadar mengecat semula permukaan.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster saliran dan takungan air — item No. 232 (sisa binaan di dalam perangkap lantai Bathroom 3), No. 267 (sisa binaan dan lurang/manhole tersumbat di Yard) dan No. 244 (kesan air bertakung pada papak Flat Roof 3). Sisa binaan yang menyumbat saliran WAJIB dikeluarkan sepenuhnya dan sistem saliran diuji lancar (flushing test), manakala kecerunan papak yang menyebabkan takungan hendaklah dibetulkan pada puncanya. Bagi tangki air domestik — item No. 293 (tangki kotor) dan No. 294 (penutup tidak tertutup rapat) — ia melibatkan kebersihan dan keselamatan bekalan air minuman keluarga saya; tangki hendaklah dibersihkan sepenuhnya dan penutup dibaiki supaya tertutup rapat bagi mengelakkan pencemaran.

5. Selain itu, item No. 199 (Bathroom 2) — jubin dinding tidak dipasang penuh hingga paras siling sedangkan spesifikasi kemasan di dalam S&P pihak tuan sendiri menyatakan "Full Height Tile to Ceiling Height". Ini merupakan KETIDAKPATUHAN kepada spesifikasi S&P, dan pihak tuan dituntut menyiapkan pemasangan jubin mengikut spesifikasi tersebut, atau mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) yang mengesahkan sebarang perubahan spesifikasi yang didakwa.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 18 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak

disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(MOHD HAFIZ SAIFUL NIZAM BIN M ROSLI)

E-mel: hafizsaifulnizam@gmail.com
Telefon: 017-737 3410

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
15 September 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Full House Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 September 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui aplikasi rasmi JLG KITA — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1); sebanyak 268 kes kecacatan direkodkan
2, 8 & 12 Oktober 2026	Pemilik menghubungi Customer Service pihak pemaju melalui WhatsApp bertanyakan status pembaikan — TIADA sebarang balasan diterima (Lampiran B)
22 Oktober 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan; 268 kes masih berstatus "In Progress" di dalam aplikasi JLG KITA (Lampiran A)
26 Oktober 2026	Pemilik sekali lagi menghubungi Customer Service melalui WhatsApp ("Sebulan da ni.. Any progress?") — masih TIADA balasan
27 & 30 Oktober 2026	TIGA (3) kes kecacatan tambahan dilaporkan di dalam aplikasi JLG KITA (Faulty Electrical — Dining Room; Cracked Ceiling — Bedroom 2; Floor — Guest Room)
3 November 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
18 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/064 daripada MOHD HAFIZ SAIFUL NIZAM BIN M ROSLI berhubung hartanah di No. 46, Jalan Perjiranan 13/3, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/064 daripada MOHD HAFIZ SAIFUL NIZAM BIN M ROSLI berhubung hartanah di No. 46, Jalan Perjiranan 13/3, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____


Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

LAMPIRAN A


Rekod Aplikasi JLG KITA Pihak Pemaju

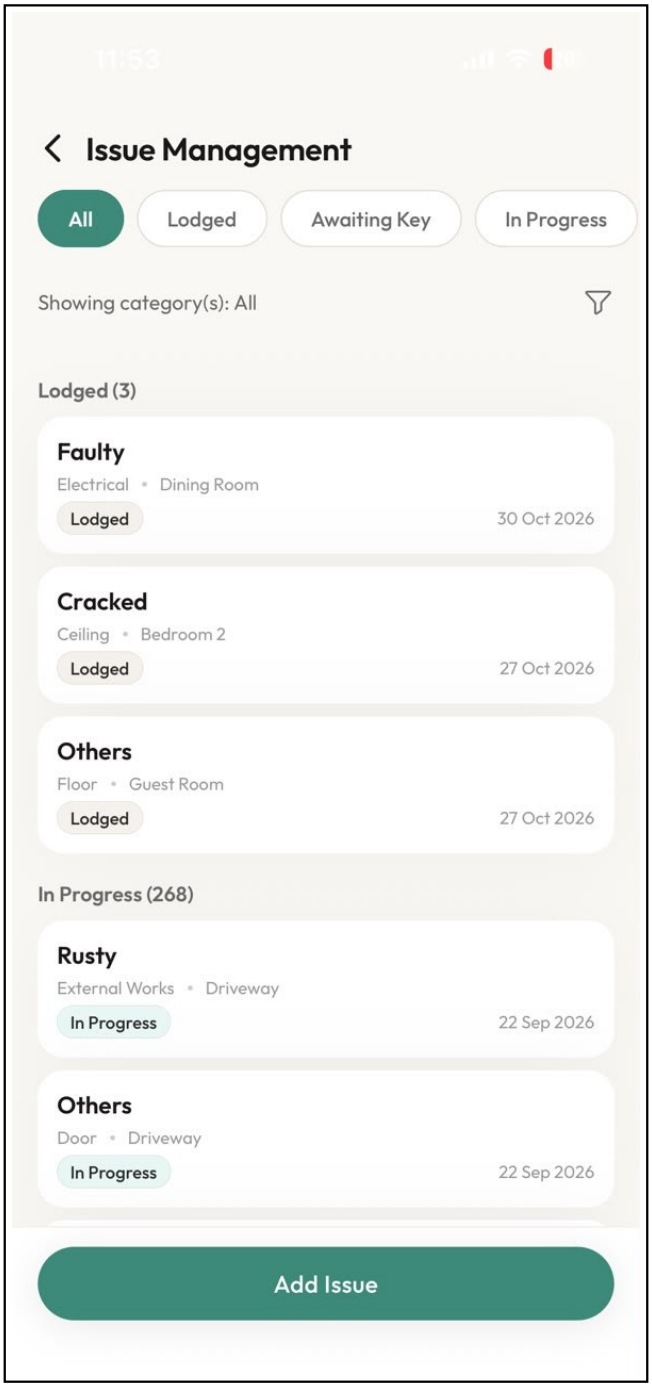

Rekod aplikasi JLG KITA menunjukkan 268 kes kecacatan masih berstatus "In Progress" sejak 22 September 2026, serta 3 kes tambahan berstatus "Lodged" (27 & 30 Oktober 2026).

LAMPIRAN B

Rekod WhatsApp Pemilik kepada Customer Service JLAND

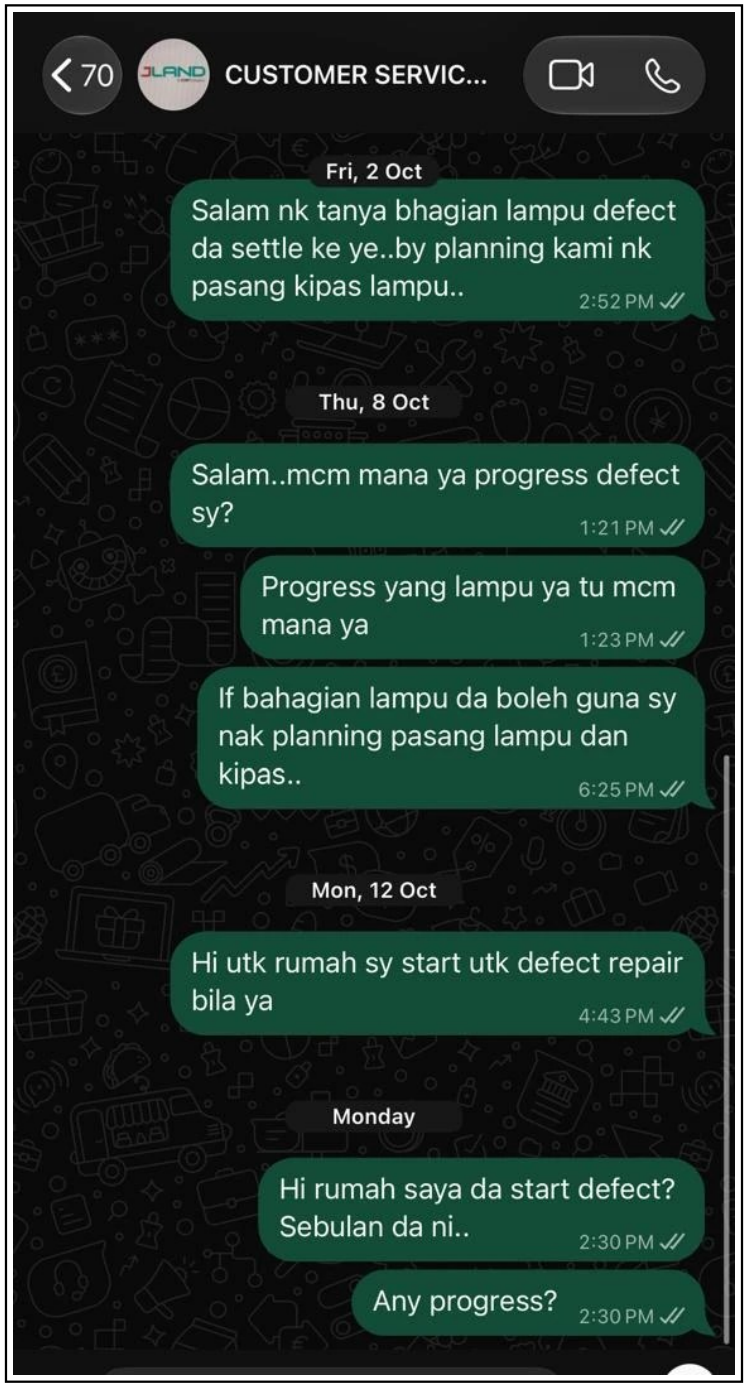

Pemilik menghubungi Customer Service pihak pemaju melalui WhatsApp pada 2, 8, 12 dan 26 Oktober 2026 bertanyakan status pembaikan — tiada sebarang balasan diterima.
