NUR ZARIFAHANA BINTI ISA
A-05-02, Pangsapuri Laman Indah, Blok A,
Laman Indah, Taman Laman Indah,
81110 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 890707-01-5474
E-mel: nurzarifahana@gmail.com
Tel: 013-216 8801

ECO BOTANIC SDN. BHD. (201301037050 / 1066879-M)
No. 9, 11, 15 & 17, Jalan Ekoperniagaan 1/6,
Taman Ekoperniagaan,
81100 Johor Bahru,
Johor.

20 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/058

Tuan/Puan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah: Unit Pangsapuri (Apartment) — Unit 05-02 di A-05-02, Pangsapuri Laman Indah, Blok A, Laman Indah, Taman Laman Indah, 81110 Johor Bahru, Johor (Lot 172257, GM 2876, Mukim Pulai)

Saya, NUR ZARIFAHANA BINTI ISA (No. K/P: 890707-01-5474), pemilik berdaftar unit hartanah di alamat di atas (Projek: Laman Indah 1 — Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual H, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 18 Januari 2023 dengan pemaju ECO BOTANIC SDN. BHD. (201301037050 / 1066879-M) (Ruj. fail: EB/PKJ/JY/NS/404/2301), merujuk kepada Notis Pertama — surat rasmi tuntutan pembaikan kecacatan bertarikh 20 Mei 2026 beserta Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan secara serahan tangan dan DITERIMA serta diakui terima oleh pihak tuan/puan pada 21 Mei 2026 (ditandatangani oleh Encik Abdullah Hakim b. Wahid dengan cop rasmi ECO BOTANIC SDN. BHD. / Pangsapuri Laman Indah — salinan Akuan Terima dilampirkan sebagai LAMPIRAN A). Notis Pertama tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 30(1) Jadual H yang mewajibkan semua kecacatan dibaiki dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah TAMAT pada 20 Jun 2026 tanpa pembaikan disempurnakan. Semakan oleh pemilik pada 7 Julai 2026, Pemeriksaan Kali Ketiga pada 11 Julai 2026 (laporan diserahkan 17 Julai 2026) dan seterusnya Pemeriksaan Kali Keempat pada 5 Oktober 2026 MENGESAHKAN bahawa KESEMUA TUJUH BELAS (17) kecacatan yang direkodkan masih belum diselesaikan — 100% berstatus "Not Complete". Perlu

ditegaskan bahawa kecacatan-kecacatan ini telah direkodkan seawal Laporan Pertama 12 April 2025 dan BERULANG walaupun pihak tuan/puan memaklumkan pembaikan selesai pada 4 Julai 2025. Malah, pada 2 Julai 2026 pihak tuan/puan telah memaklumkan melalui WhatsApp bahawa unit saya "dah completed" dan kunci boleh diambil — namun gambar-gambar kecacatan yang saya hantar pada 10 Julai 2026 serta pengakuan pihak tuan/puan sendiri pada 30 Julai 2026 bahawa "site team tengah buat floor hollow... target siap next week" mengesahkan bahawa makluman tersebut merupakan SALAH NYATA STATUS PEMBAIKAN (rujuk Lampiran B). Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Kitchen — Dinding	Dinding tidak sejajar — masih ada (Alignment issue on wall, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
2	Kitchen — Dinding	Dinding tidak sejajar — masih ada (Wall misaligned, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
3	Kitchen — Dinding	Dinding tidak sejajar — masih ada (Still have alignment issue on wall)	Masih Belum Diselesaikan
4	Kitchen — Dinding	Dinding masih tidak sejajar (Wall still misaligned)	Masih Belum Diselesaikan
5	Kitchen — M&E	Isu pemasangan pada titik lampu — menyukarkan pemasangan lampu oleh pemilik (Installation issue at lighting point — may make it difficult for owner to install lamp)	Masih Belum Diselesaikan
6	Yard — Pintu	Bahagian bawah pintu masih tidak dicat sepenuhnya (Bottom of door still not fully painted — Finishing issue)	Masih Belum Diselesaikan
7	Master Bedroom — Dinding	Berongga dengan keretakan pada dinding bercat SELEPAS kerja pembaikan (Hollow with crack on painted wall after rectification work — new defect arising from rectification)	Masih Belum Diselesaikan
8	Master Bathroom — Siling	Karat pada rangka siling masih ada (Rusty on ceiling frame, still observed)	Masih Belum Diselesaikan

9	Bedroom 2 — Lantai	Keretakan dengan bunyi berongga pada papak masih ada (Crack with hollow sound on slab, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
10	Bedroom 2 — Lantai	Bunyi berongga pada papak masih ada (Hollow sound on slab, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
11	Bedroom 2 — Dinding	Dinding masih tidak sejajar (Misaligned wall, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
12	Bedroom 3 — Lantai	Keretakan dengan bunyi berongga pada papak masih ada (Crack with hollow sound on slab, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
13	Bedroom 3 — Lantai	Bunyi berongga pada papak masih ada (Hollow sound on slab, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
14	Bedroom 3 — Dinding	Dinding masih tidak sejajar (Wall still misaligned)	Masih Belum Diselesaikan
15	Bathroom 2 — Dinding	Dinding beralun dan tidak sejajar masih ada (Wavy and misaligned wall, still observed)	Masih Belum Diselesaikan
16	Bathroom 2 — Fixtures	Penyendal (seal) pada basin tiada (Missing seal on basin — Jointing issue)	Masih Belum Diselesaikan
17	Balcony — Lantai	Keretakan pada papak lantai SELEPAS kerja pembaikan (Crack on floor slab after rectification work — new defect arising from rectification)	Masih Belum Diselesaikan

**Senarai di atas adalah berdasarkan Laporan Pemeriksaan terkini (status pada 5 Oktober 2026) oleh Surveyor Bangunan Berdaftar (RISM). Butiran penuh beserta gambar adalah sebagaimana di dalam laporan tersebut, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada kluster ketidaksejajaran dinding (wall alignment) — item No. 1 hingga 4 (Kitchen, EMPAT titik berasingan), No. 11 (Bedroom 2), No. 14 (Bedroom 3) dan No. 15 (Bathroom 2, dinding beralun). Kecacatan ini telah direkodkan seawal Laporan Pertama pada 12 April 2025, didakwa telah dibaiki pada 4 Julai 2025, namun BERULANG di lokasi yang sama dalam setiap pemeriksaan berikutnya — bukti jelas bahawa kaedah pembaikan yang digunakan tidak menyelesaikan punca dan tidak mengikut amalan pembinaan yang baik. Pembaikan semula hendaklah dilakukan secara menyeluruh (bukan tampalan kosmetik) dan disahkan dengan ukuran.

4. Lebih membimbangkan, item No. 7 (berongga dengan keretakan pada dinding

bercat Master Bedroom) dan item No. 17 (keretakan pada papak lantai Balcony) adalah kecacatan BARU yang timbul DARIPADA kerja pembaikan pihak tuan/puan sendiri (new defects arising from rectification work). Ini menunjukkan kualiti kerja pembaikan yang tidak memuaskan dan menambahkan lagi kerosakan kepada unit. Begitu juga kluster berongga dan keretakan pada papak lantai — item No. 9, 10 (Bedroom 2) dan No. 12, 13 (Bedroom 3) — yang hendaklah dibaiki dengan kaedah hack dan skrid semula mengikut amalan pembinaan yang baik.

5. Bagi item No. 5 (isu pemasangan pada titik lampu Kitchen): sekiranya pihak tuan/puan mendakwa keadaan tersebut adalah mengikut reka bentuk asal atau di dalam had toleransi, pihak tuan/puan dituntut mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) — lukisan reka bentuk yang diluluskan atau spesifikasi — sebagai bukti; jika tidak, ia hendaklah dibetulkan supaya tidak menyukarkan pemasangan lampu oleh pemilik. Item No. 8 (karat pada rangka siling Master Bathroom) hendaklah dirawat atau diganti bagi mengelakkan merebak.

6. Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah dalam tempoh 24 bulan selepas penyerahan milikan kosong hendaklah dibaiki dan diperbetulkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas penerimaan notis bertulis, atas kos dan belanja pihak yang bertanggungjawab sendiri.

7. Berikutan kegagalan berterusan pihak tuan/puan, saya telah mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah bagi kerja-kerja membaiki kecacatan yang masih tertunggak — merangkumi pembaikan dinding senget dan tidak selari (lebih kurang 25 meter persegi), pemecahan dan lepaan semula dinding berongga, pembaikan permukaan lantai slab yang berongga (lebih kurang 10 meter persegi), pengecatan semula bahagian bawah pintu serta kerja pembersihan — dengan JUMLAH BESAR sebanyak RM15,750.00 (Ringgit Malaysia: Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sahaja). Salinan jadual kerja dan harga dilampirkan sebagai LAMPIRAN C. Sekiranya pembaikan tidak disempurnakan menjelang TARIKH MUKTAMAD di bawah, keseluruhan kos ini akan dituntut sepenuhnya daripada pihak yang bertanggungjawab.

8. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan/puan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan SEPENUHNYA dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 4 November 2026 (TARIKH MUKTAMAD). Tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepas tarikh tersebut.

9. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan sepenuhnya selepas TARIKH MUKTAMAD tersebut, saya akan, tanpa notis lanjut:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) di bawah Akta 118 dan Peraturan-peraturan TTPR 2002;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah dan menuntut sepenuhnya kos tersebut daripada pihak yang bertanggungjawab, termasuk melalui notis kepada peguam pemegang amanah (stakeholder) supaya MENAHAN wang tahanan lima peratus (5%) di bawah Klausa 30(2) Jadual H;
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Pejabat Pengawal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk siasatan lanjut; dan
    - Mengambil apa-apa tindakan undang-undang lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

10. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

11. Adalah ditegaskan bahawa ini merupakan NOTIS TERAKHIR yang akan dikeluarkan sebelum tindakan undang-undang diambil. Kegagalan pihak tuan/puan mematuhi notis ini sepenuhnya sebelum atau pada 4 November 2026 akan mengakibatkan tuntutan difailkan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) dan/atau apa-apa remedi lain di bawah Akta 118, tanpa sebarang rujukan lanjut kepada pihak tuan/puan.

Saya berharap pihak tuan/puan mengambil tindakan segera terhadap Notis Akhir ini. Atas kerjasama dan perhatian diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(NUR ZARIFAHANA BINTI ISA)
No. K/P: 890707-01-5474
E-mel: nurzarifahana@gmail.com
Telefon: 013-216 8801

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
18 Januari 2023	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement, Jadual H) ditandatangani dengan ECO BOTANIC SDN. BHD. — Laman Indah 1 (Ruj. fail: EB/PKJ/JY/NS/404/2301)
12 April 2025	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan oleh Surveyor Bangunan Berdaftar (RISM)
25 Mei 2025	Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama diserahkan kepada pihak pengurusan
4 Julai 2025	Pihak pengurusan/pemaju memaklumkan kerja pembaikan telah selesai
9 Mei 2026	Pemeriksaan Kali Kedua (Second Inspection) — kecacatan didapati BERULANG di lokasi yang sama selepas lebih kurang 13 bulan, dan sebahagiannya semakin bertambah
21 Mei 2026	Surat rasmi beserta Laporan Pemeriksaan Kedua diserahkan secara serahan tangan ke Pejabat Pengurusan Laman Indah — merupakan Notis Pertama / notis bertulis di bawah Klausa 30(1) Jadual H (tempoh pembaikan 30 hari); DITERIMA dan diakui terima pada 21 Mei 2026 oleh Encik Abdullah Hakim b. Wahid dengan cop rasmi Eco Botanic Sdn. Bhd. / Pangsapuri Laman Indah (rujuk Lampiran A)
20 Jun 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan — pembaikan masih belum diselesaikan
2 Julai 2026	Pihak pengurusan memaklumkan melalui WhatsApp bahawa unit "dah completed" dan kunci boleh diambil — kemudiannya didapati tidak benar (rujuk Lampiran B)
7 Julai 2026	Semakan oleh pemilik — kebanyakan kecacatan masih belum disiapkan
10 Julai 2026	Pemilik menghantar gambar-gambar kecacatan yang masih wujud melalui WhatsApp kepada pihak pengurusan
11 Julai 2026	Pemeriksaan Kali Ketiga (Third Inspection / Re-Inspection) dijalankan
17 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Ketiga (softcopy) diserahkan kepada pihak pengurusan melalui WhatsApp (rujuk Lampiran B)

30 Julai 2026	Pengakuan pihak pengurusan melalui WhatsApp bahawa kerja pembaikan masih berjalan ("site team tengah buat floor hollow, target siap next week")
21 Ogos 2026	Pemilik bertanya status terkini dan lokasi kunci melalui WhatsApp — tiada penyelesaian
5 Oktober 2026	Pemeriksaan Kali Keempat (Fourth Inspection) dijalankan — SEMUA 17 kecacatan direkodkan masih belum diselesaikan (100% Not Complete)
20 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
4 November 2026	TARIKH MUKTAMAD pembaikan (15 hari dari Notis Akhir)

Salinan Pejabat Pengurusan (Management's Copy)

AKUAN TERIMA

(Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO BOTANIC SDN. BHD. (201301037050 / 1066879-M) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 20 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/058 daripada NUR ZARIFAHANA BINTI ISA berhubung hartanah di A-05-02, Pangsapuri Laman Indah, Blok A, Laman Indah, Taman Laman Indah, 81110 Johor Bahru, Johor (Lot 172257, GM 2876, Mukim Pulai).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Pejabat (Office Stamp):

Salinan Pemilik (Owner's Copy)

AKUAN TERIMA

(Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO BOTANIC SDN. BHD. (201301037050 / 1066879-M) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 20 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/058 daripada NUR ZARIFAHANA BINTI ISA berhubung hartanah di A-05-02, Pangsapuri Laman Indah, Blok A, Laman Indah, Taman Laman Indah, 81110 Johor Bahru, Johor (Lot 172257, GM 2876, Mukim Pulai).

Diterima oleh:

Nama : _____


Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Pejabat (Office Stamp):

LAMPIRAN A

Akuan Terima Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)

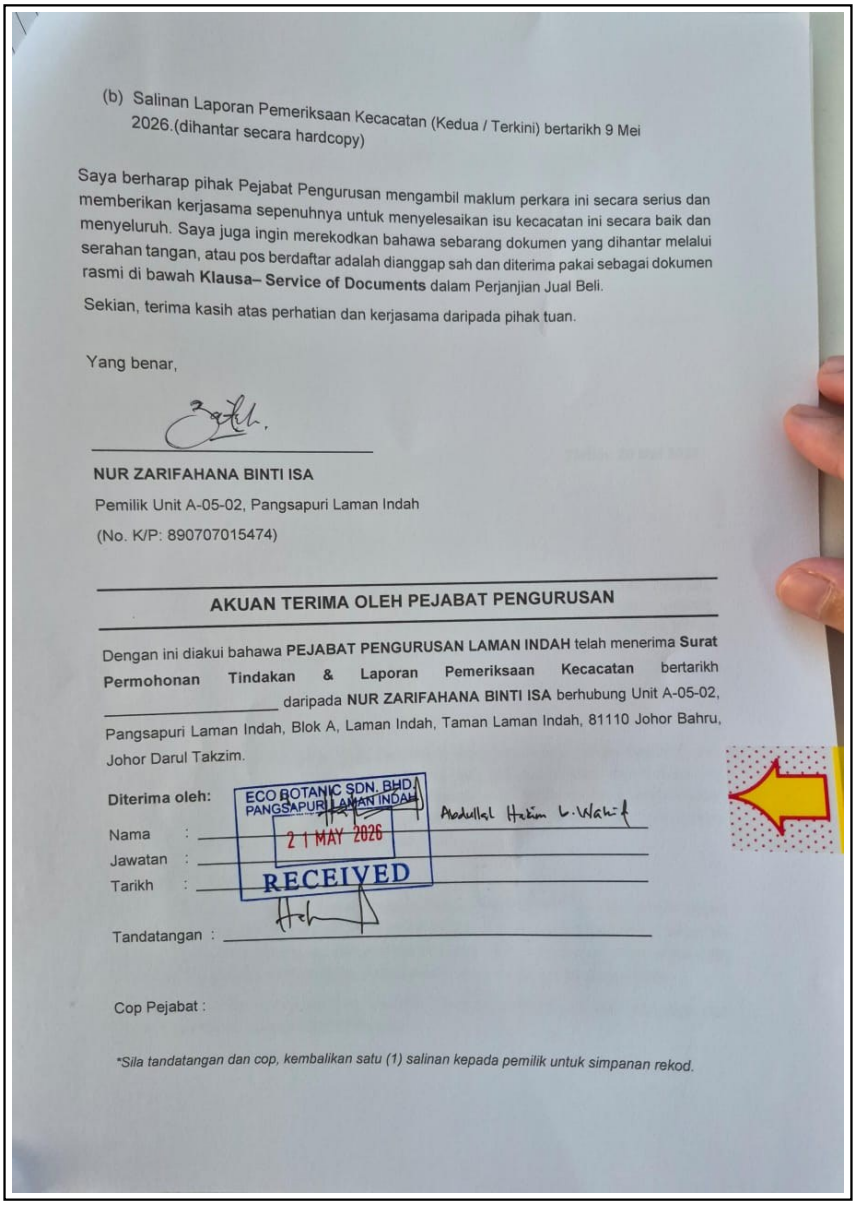

(b) Salinan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Kedua / Terkini) bertarikh 9 Mei 2026.(dihantar secara hardcopy)

Saya berharap pihak Pejabat Pengurusan mengambil maklum perkara ini secara serius dan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menyelesaikan isu kecacatan ini secara baik dan menyeluruh. Saya juga ingin merekodkan bahawa sebarang dokumen yang dihantar melalui serahan tangan, atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi di bawah **Klausa– Service of Documents** dalam Perjanjian Jual Beli.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan.

Yang benar,

NUR ZARIFAHANA BINTI ISA

Pemilik Unit A-05-02, Pangsapuri Laman Indah

(No. K/P: 890707015474)

AKUAN TERIMA OLEH PEJABAT PENGURUSAN

Dengan ini diakui bahawa **PEJABAT PENGURUSAN LAMAN INDAH** telah menerima **Surat Permohonan Tindakan & Laporan Pemeriksaan Kecacatan** bertarikh _____ daripada **NUR ZARIFAHANA BINTI ISA** berhubung Unit A-05-02, Pangsapuri Laman Indah, Blok A, Laman Indah, Taman Laman Indah, 81110 Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

Diterima oleh:

ECO BOTANIC SDN. BHD.
PANGSAPURI LAMAN INDAH
21 MAY 2026
RECEIVED

Nama : Abdullah Hakim b. Wahid

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Tandatangan : _____

Cop Pejabat :

**Sila tandatangan dan cop, kembalikan satu (1) salinan kepada pemilik untuk simpanan rekod.*

Notis Pertama bertarikh 20 Mei 2026 diserahkan secara serahan tangan dan diakui terima pada 21 Mei 2026 — ditandatangani oleh Encik Abdullah Hakim b. Wahid dengan cop rasmi ECO BOTANIC SDN. BHD. / Pangsapuri Laman Indah (RECEIVED).

LAMPIRAN B


Bukti Serahan Laporan & Komunikasi WhatsApp dengan Pihak Pengurusan



Lampiran B-1: Serahan laporan pemeriksaan pertama (softcopy) kepada pihak pengurusan (Cik Syafiqah, EcoWorld) pada 26 Mei 2025 — disahkan terima; dan makluman pihak pengurusan pada 4 Julai 2025 bahawa kerja pembaikan telah siap.

LAMPIRAN B

Bukti Serahan Laporan & Komunikasi WhatsApp dengan Pihak Pengurusan

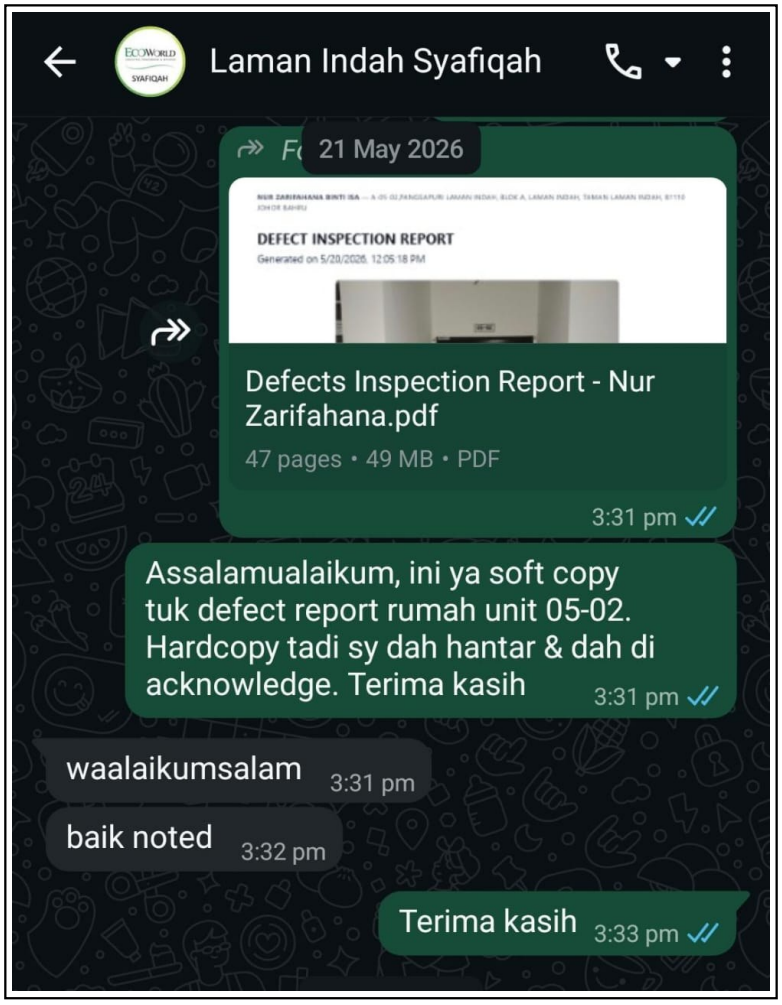

Lampiran B-2: Serahan laporan pemeriksaan kedua (softcopy) kepada Cik Syafiqah pada 21 Mei 2026 — hardcopy telah diserahkan dan diakui terima pada hari yang sama.

LAMPIRAN B

Bukti Serahan Laporan & Komunikasi WhatsApp dengan Pihak Pengurusan



Lampiran B-3: Serahan laporan pemeriksaan kedua (softcopy) kepada En. Hakim (Pejabat Pengurusan Laman Indah) pada 21 Mei 2026 — diakui terima untuk diserahkan kepada PIC.

LAMPIRAN B

Bukti Serahan Laporan & Komunikasi WhatsApp dengan Pihak Pengurusan



Lampiran B-4: Serahan Laporan Pemeriksaan Semula / Ketiga (softcopy, 43 muka) kepada En. Hakim pada 17 Julai 2026.

LAMPIRAN C

Sebut Harga Rasmi Pembaikan (Official Repair Quotation) — RM15,750.00

1. Jadual kerja dan harga

Semua harga dalam Ringgit Malaysia (RM), termasuk bahan dan upah, tidak termasuk SST (jika berkenaan).

No.	Perincian kerja	Unit	Jumlah (RM)
1	**Membaiki dinding yang senget dan tidak selari** Buang plaster sedia ada pada kawasan terlibat, plaster semula bagi mendapatkan permukaan dinding yang tegak dan selari, kemasan skim coat dan cat semula 2 lapis. **Had merangkumi lebih kurang 25 m² permukaan dinding.** Kuantiti melebihi had dicaj sebagai kerja tambahan.	L/S	10,000.00
2	**Memecah plaster dinding hollow, render semula, skim dan cat semula** Lebih kurang 1–3 m² (2 titik). Pecah plaster yang berbunyi kosong, render semula, skim coat dan cat semula sehingga sepadan dengan kawasan sekeliling.	L/S	1,800.00
3	**Memecah permukaan lantai slab yang kosong, simen dan render semula** Pecah permukaan lantai yang berbunyi kosong sehingga permukaan padu, bersihkan, kemudian simen dan render semula dengan mortar yang sesuai. **Had merangkumi lebih kurang 10 m² permukaan lantai.** Kuantiti melebihi had dicaj sebagai kerja tambahan.	L/S	3,500.00
4	**Mengecat semula bahagian bawah pintu yang tidak dicat** Bersihkan permukaan dan cat semula bahagian bawah pintu 2 lapis mengikut warna sedia ada. Sehingga 6 daun pintu.	L/S	150.00
5	**Kerja pembersihan dan housekeeping** Bersihkan kotoran yang melekat pada kawasan kerja dan kemas tapak selepas kerja siap, termasuk pelupusan sisa binaan am.	L/S	300.00
		JUMLAH BESAR (RM)	**15,750.00**

Jadual kerja dan harga daripada kontraktor bertauliah bagi kerja pembaikan kecacatan yang masih tertunggak — Jumlah Besar RM15,750.00 (tidak termasuk SST, jika berkenaan).
