NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS
No. 31, Jalan Silat Cekak 15,
Bandar Selesa Jaya,
81300 Skudai,
Johor.

No. K/P: 931207-01-6292
E-mel: nurshafiqa.yunus@yahoo.com
Tel: 017-707 1400

PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T)
(Management Office)
Apartment Bayu Permas,
Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Masai, Johor. 21 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/045

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah: Pangsapuri — Parcel B-01-03, Tingkat 1, Blok B di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor

Saya, NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS (No. K/P: 931207-01-6292), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Apartmen Bayu Permas, Mukim Plentong (PTD 250169)), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual H, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 10 Julai 2024 dengan rujukan 835-12/eSPA/230524/B-01-03/01, merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/045 bertarikh 18 September 2026, yang telah diserahkan dan DITERIMA serta diakui terima oleh pihak tuan pada hari yang sama — oleh Puan Nurdayanee Abdul Hadi (Management) dan En. Azwan bin Azhar, dengan cop rasmi RECEIVED 18 SEP 2026 (salinan Akuan Terima dilampirkan sebagai LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B). Notis Pertama tersebut memberikan tempoh lima belas (15) hari kepada pihak tuan untuk menyiapkan semua kerja pembaikan, iaitu sehingga 3 Oktober 2026.

2. Namun, tempoh Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 3 Oktober 2026 tanpa semua pembaikan disempurnakan. Walaupun pihak tuan memaklumkan pada 12 Oktober 2026 bahawa kerja pembaikan telah siap, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 14 Oktober 2026 MENGESAHKAN bahawa SEMBILAN (9) kecacatan masih belum diselesaikan. Ini jelas menunjukkan kegagalan berterusan pihak tuan mematuhi Notis Pertama. Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
12	Master Bedroom — Dinding	Ketidakjajaran ketara pada permukaan dinding masih ada (Visible alignment issue on wall surface, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
15	Master Bedroom — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat masih ada (Hollow sound on painted wall, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
17	Master Bathroom — Lantai	Air bertakung pada jubin lantai masih ada (Stagnant water on floor tile, still observed)	Belum Dibaiki
20	Master Bathroom — Dinding	Keretakan pada dinding luar masih ada (Crack on external wall, still observed)	Belum Dibaiki
24	Bedroom 2 — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
27	Bedroom 2 — Lantai Kayu	Lantai kayu tenggelam/mendap masih ada (Sunken timber flooring, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
34	Bedroom 3 — Lantai Kayu	Skirting tidak sejajar masih ada (Skirting exhibits an alignment issue, still observed)	Belum Dibaiki
40	Balcony — Lantai	Bunyi berongga pada papak lantai masih ada (Hollowness on floor slab, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
44	Balcony — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat masih ada (Hollow sound on painted wall, still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas merujuk kepada penemuan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) pada 14 Oktober 2026. Senarai lengkap kecacatan asal terkandung di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang diserahkan pada undefined serta Notis Pertama, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada kluster BUNYI BERONGGA (hollowness) — item No. 15 (dinding Master Bedroom), No. 24 (dinding Bedroom 2), No. 40 (papak lantai Balcony) dan No. 44 (dinding Balcony) — yang masih wujud walaupun telah melalui dua pusingan "pembaikan". Lekatan lepaan/skrid yang tidak sempurna berisiko retak dan tertanggal, dan hendaklah dibaiki dengan

kaedah hack dan lepa/skrid semula mengikut amalan pembinaan yang baik, bukan tampalan kosmetik. Item No. 12 — ketidakjajaran ketara pada dinding Master Bedroom — turut masih ada dan hendaklah diperbetulkan mengikut piawaian kerja yang sepatutnya.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 17 — air bertakung pada jubin lantai Master Bathroom yang masih ada: kecerunan (falls) lantai hendaklah dibetulkan supaya air mengalir sepenuhnya ke arah floor trap, dan bukan sekadar dikeringkan. Item No. 20 — keretakan pada dinding luar Master Bathroom — hendaklah dibaiki dengan sempurna; manakala item No. 27 (lantai kayu tenggelam/mendap di Bedroom 2) dan No. 34 (skirting tidak sejajar di Bedroom 3) memerlukan pembaikan pada ASAS/substrat lantai dan pemasangan semula yang betul, bukan sekadar penggantian permukaan.

5. Pihak tuan turut diingatkan bahawa Laporan Pemeriksaan Elektrikal (Electrical Inspection Report) bagi unit ini — mengandungi dua belas (12) penemuan serius yang melibatkan KESELAMATAN penghuni — telah dikemukakan secara serahan tangan (hardcopy) pada akhir Ogos 2026, dan kesemua penemuan tersebut hendaklah diselesaikan oleh orang kompeten (competent person) tanpa kelewatan lanjut.

6. Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 5 November 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya.

8. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas TARIKH MUKTAMAD tersebut, saya akan, tanpa notis lanjut:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah dan menuntut supaya kos pembaikan

ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh pemegang amanah (stakeholder), selaras dengan Klausa 30(2) Jadual H Perjanjian Jual Beli;

- Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
- Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Adalah ditegaskan bahawa ini merupakan NOTIS TERAKHIR yang akan dikeluarkan sebelum tindakan undang-undang diambil. Kegagalan pihak tuan mematuhi notis ini sepenuhnya sebelum atau pada 5 November 2026 akan mengakibatkan tuntutan difailkan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) dan/atau apa-apa remedi lain di bawah Akta 118, tanpa sebarang rujukan lanjut kepada pihak tuan.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Akhir ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS)
No. K/P: 931207-01-6292
E-mel: nurshafiqa.yunus@yahoo.com
Telefon: 017-707 1400

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H (Ruj: 835-12/eSPA/230524/B-01-03/01)
7 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
10 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) di pejabat pengurusan pihak pemaju, beserta kunci unit — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 30(1)
9 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
18 September 2026	Notis Pertama (NOTIS-1/2026/045) dikeluarkan dan diserahkan — DITERIMA dan diakui terima pada hari yang sama oleh Puan Nurdayanee Abdul Hadi (Management) dan En. Azwan bin Azhar, dengan cop rasmi RECEIVED 18 SEP 2026 (rujuk Lampiran A dan B)
3 Oktober 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — pembaikan masih tidak disempurnakan
12 Oktober 2026	Pihak pemaju memaklumkan kerja pembaikan telah siap
14 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — SEMBILAN (9) kecacatan masih belum diselesaikan
21 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/045
5 November 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 21 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 21 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____


Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

LAMPIRAN A

Bukti Serahan Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)

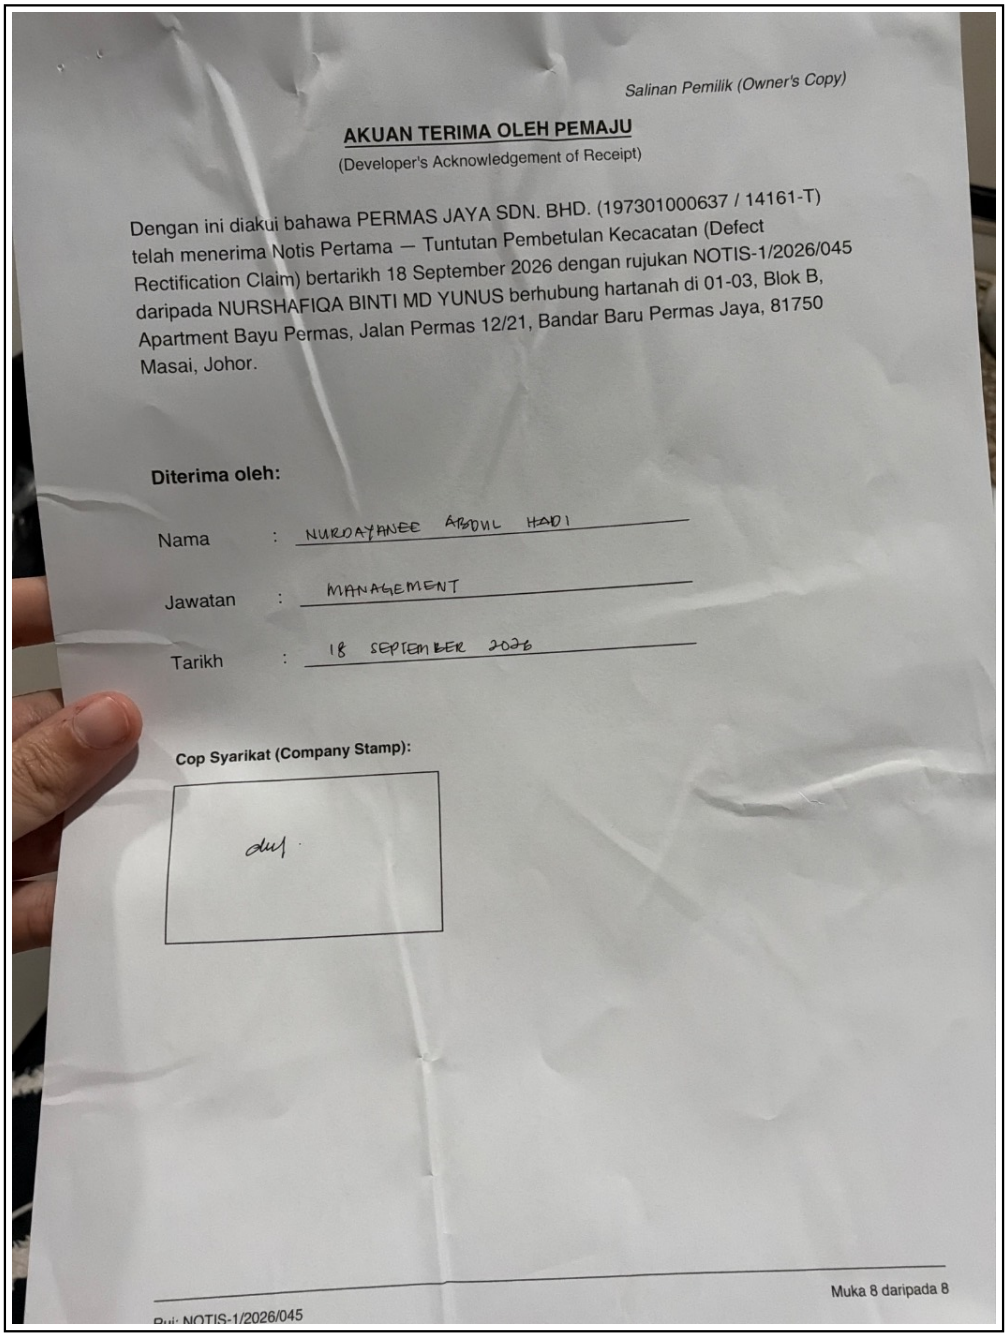

Salinan Pemilik (Owner's Copy)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : NURDAYANEE ABDUL HADI

Jawatan : MANAGEMENT

Tarikh : 18 SEPTEMBER 2026


Cop Syarikat (Company Stamp):

Ruj: NOTIS-1/2026/045 Muka 8 daripada 8

Akuan Terima Notis Pertama (NOTIS-1/2026/045) bertarikh 18 September 2026 — diterima dan diakui terima oleh Puan Nurdayanee Abdul Hadi (Management) pada 18 September 2026.

LAMPIRAN B

Bukti Serahan Notis Pertama (Proof of Service of First Notice)

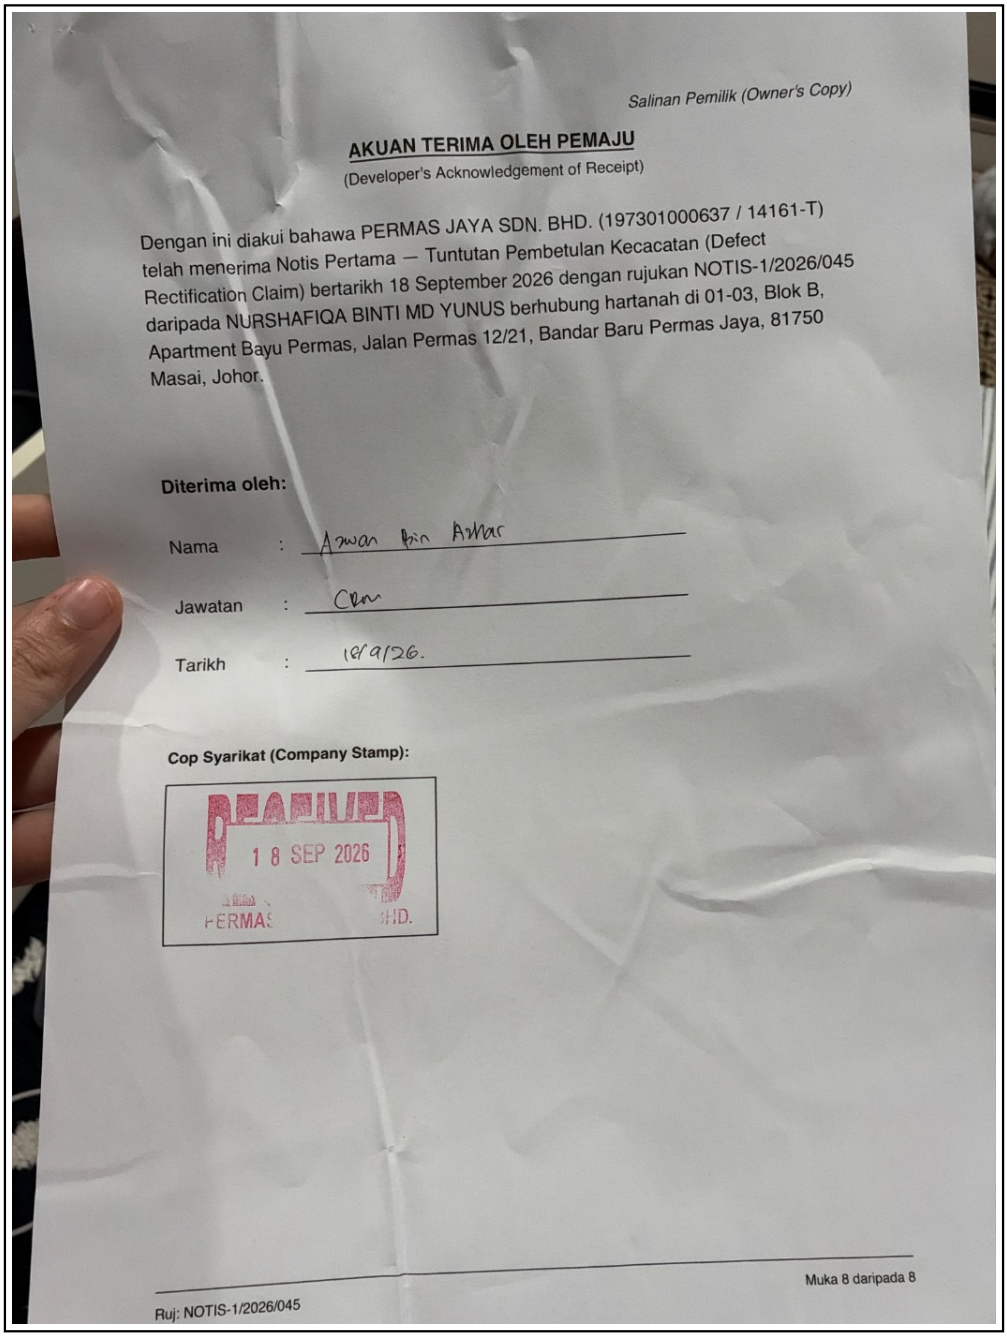

Salinan Pemilik (Owner's Copy)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : Azwan bin Azhar

Jawatan : Clerk

Tarikh : 18/9/26.

Cop Syarikat (Company Stamp):

RECEIVED 18 SEP 2026 PERMAS SDN. BHD.

Ruj: NOTIS-1/2026/045 Muka 8 daripada 8

Akuan Terima Notis Pertama (NOTIS-1/2026/045) bertarikh 18 September 2026 — diterima dan diakui terima oleh En. Azwan bin Azhar pada 18 September 2026, dengan cop rasmi RECEIVED 18 SEP 2026.
